



Procedimientos de Alineamiento de los Planes de TI/SI con la Estrategia de Negocio

Cómo integrar sistemáticamente los Sistemas de Información con la estrategia corporativa mediante metodologías estructuradas de planificación.

CAPÍTULO 5

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SI

Evolución Histórica de la Planificación de SI

La planificación de sistemas de información ha atravesado **cuatro fases diferenciadas**, desde la introducción de la informática hasta la interdependencia plena entre TI y estrategia de empresa.

1

Fase I

Introducción de la informática en la organización

2

Fase II

Expansión anárquica de las aplicaciones

3

Fase III

Coordinación SI-objetivos de empresa

4

Fase IV

Interdependencia estrategia-TI/SI




Fases I y II: Aislamiento y Anarquía

Fase I — Introducción (años 60)

La informática se incorpora para **reducir costes** en procesos administrativos (contabilidad, nómina, facturación). El departamento de Proceso de Datos queda aislado del resto de la organización. No existe planificación formal: se implementan peticiones de usuario según análisis coste-beneficio estrictamente económico.

Fase II — Expansión Anárquica

Con los procesos básicos mecanizados, surgen aplicaciones transaccionales **disjuntas y disfuncionales**. SI asigna recursos según: facilidad de implementación, atractivo tecnológico, poder del solicitante o coste del desarrollo. Los criterios **no son coherentes** con los objetivos estratégicos, que el responsable de SI desconoce.

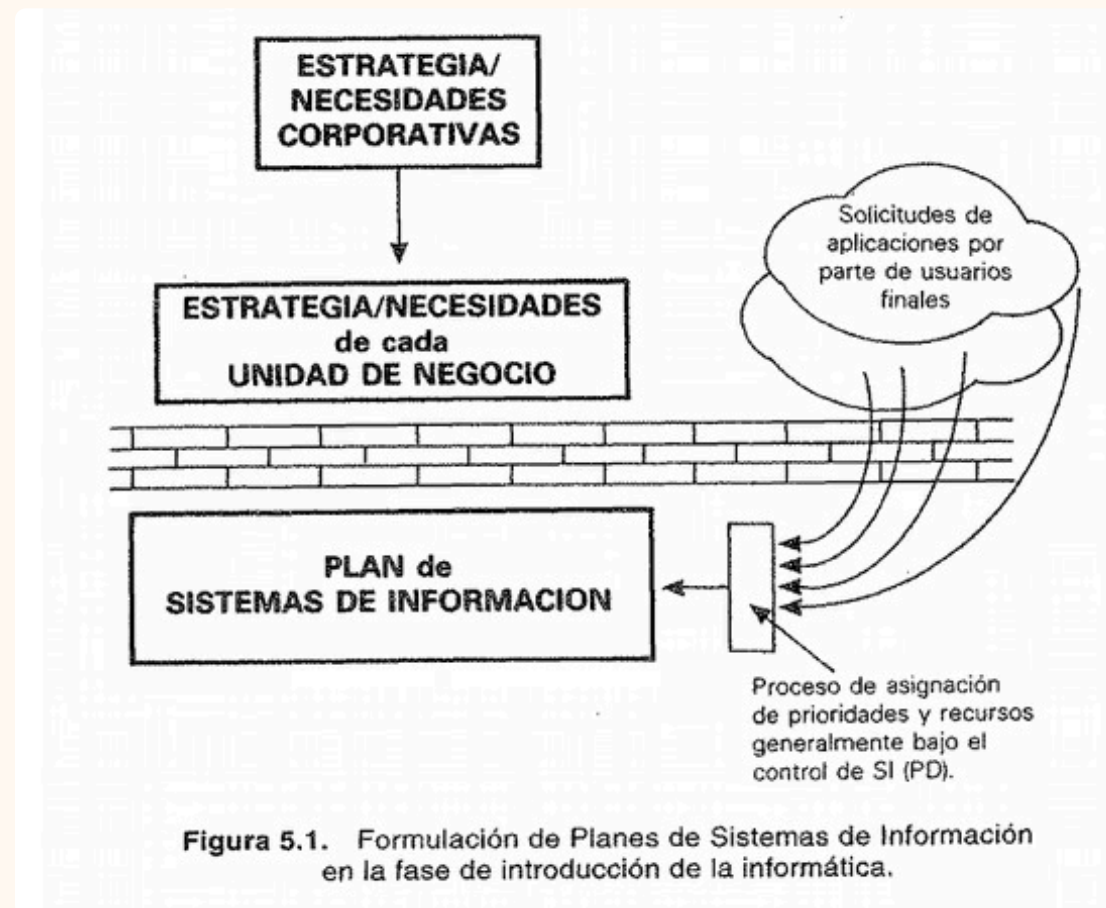

Fases III y IV: Coordinación e Interdependencia

Fase III — Coordinación SI-Objetivos

Las grandes inversiones y las quejas de usuarios impulsan a la alta dirección a intervenir en la asignación de recursos. Se establecen **planes sistemáticos** alineados con los objetivos estratégicos, «derribando la pared» entre SI y la empresa. El responsable de SI pasa a ser **coordinador** del equipo interdepartamental.

Fase IV — Interdependencia Estrategia-TI/SI

La dirección busca **ventajas competitivas sostenibles** mediante el uso activo de las TI. No basta con apoyar la estrategia: es necesario **integrar las posibilidades de TI/SI al formularla**.

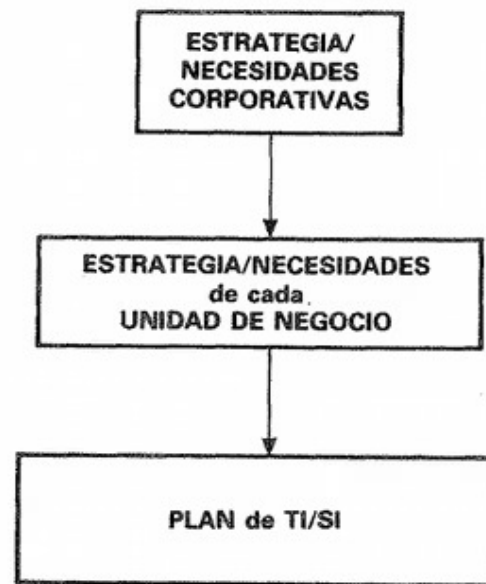


Figura 5.3. Formulación de Planes de Tecnologías y Sistemas de Información coherentemente con los planes estratégicos de la compañía.

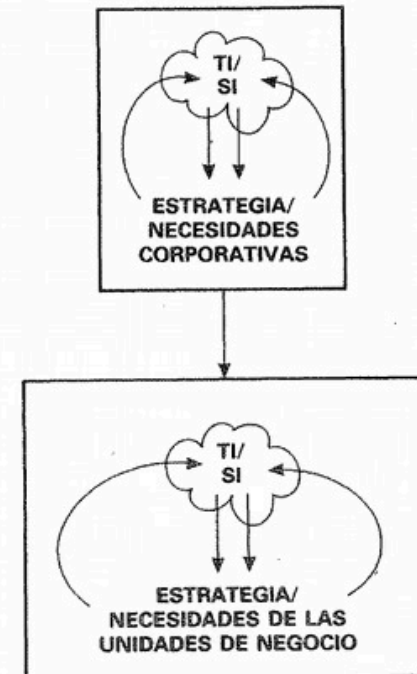


Figura 5.4. Formulación de Planes de Sistemas de Información conjuntamente con los planes estratégicos de la compañía.



En muchas organizaciones los SI se encuentran aún en la fase de expansión anárquica. Usualmente es más fácil llegar al método activo por vía evolutiva, usando primero una metodología pasiva que ayude a crear la cultura organizativa necesaria.



¿Qué debe incluir un Plan de TI/SI?

El Plan de TI/SI debe tener una perspectiva fundamentalmente de **negocio**, no tecnológica. Los detalles técnicos se incluyen solo cuando es estrictamente necesario.

Lista de proyectos

A desarrollar en los próximos **3-5 años**, con prioridad contemplando importancia para el negocio y aspectos técnicos.

Situación de partida

Reconocimiento explícito del estado actual de TI/SI, con juicio crítico desde perspectiva de **negocio**.

Detalle del primer año

Suficiente para evaluación de **recursos necesarios** e inclusión en el presupuesto anual.

Mecanismos de control

Calendario y presupuesto detallados, y lista de actividades donde TI puede aumentar eficacia o eficiencia.

Esquema General del Procedimiento de Alineamiento

El procedimiento integra las necesidades de información con las directrices estratégicas de la empresa. Requiere tres grupos de trabajo con roles definidos:



Comité de TI/SI

Órgano con responsabilidad última. Formado por el máximo responsable de la compañía, responsables de áreas funcionales y director de SI. **Aprueba el Plan** y proporciona criterios estratégicos para prioridades y recursos.



Equipo de Trabajo

Lleva a cabo el trabajo operativo. Dirigido formalmente por el director de SI, con dirección diaria del **Director Operativo de Proyecto (DOP)**. Integrado por personal de Sistemas y de departamentos usuarios.



Grupo Base

Subdirector a cargo de SI, director de SI, DOP y consultores externos. **Facilita la negociación** entre usuarios, asegura consistencia y supervisa al equipo de trabajo con mayor asiduidad que el comité.

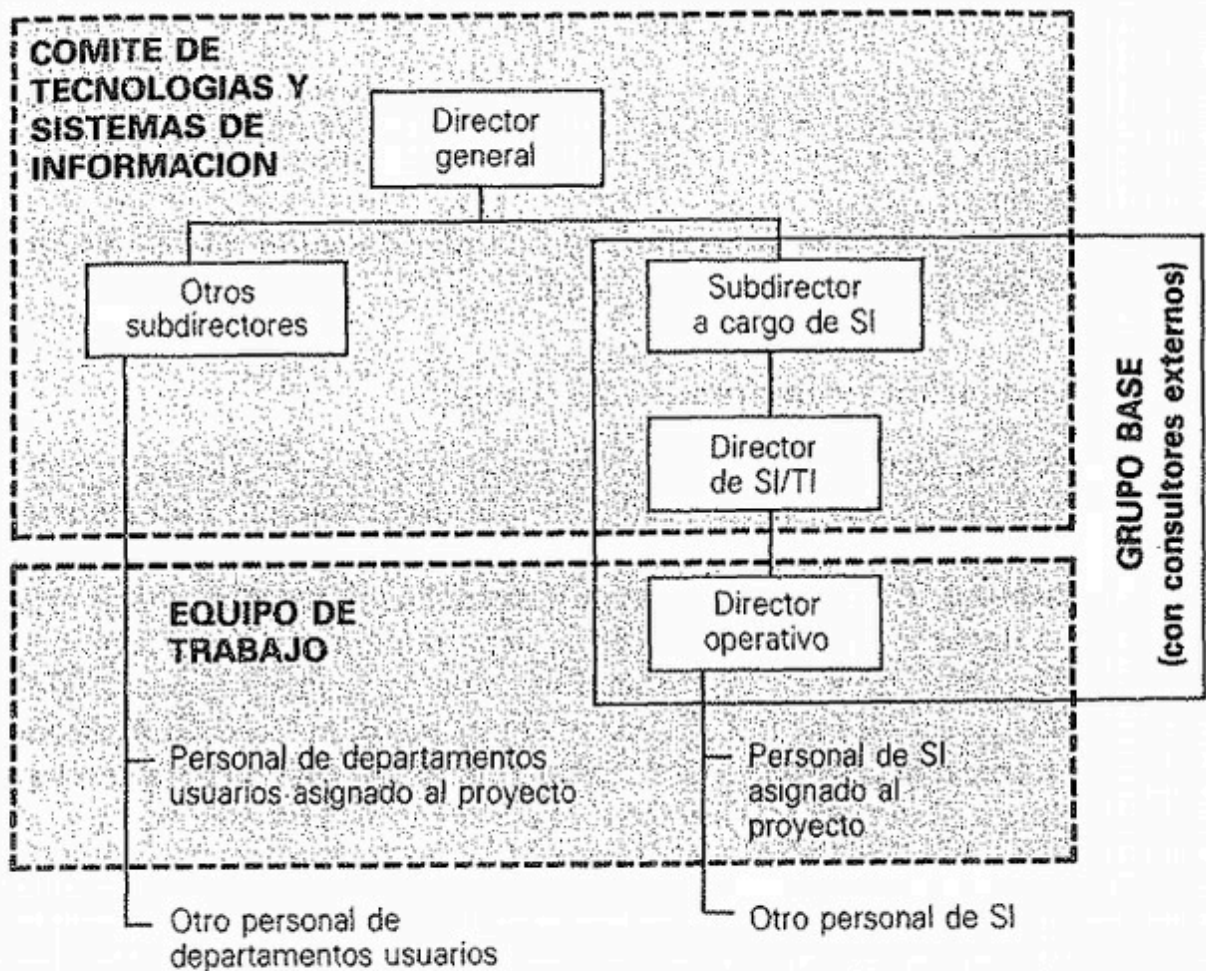


Figura 5.7. Distintos grupos de trabajo que intervienen en el proceso de planificación.

Presentación, Compromiso y Situación Actual

Fase I — Presentación y Compromiso

La **alta dirección debe tomar explícitamente** la decisión de elaborar el Plan y comprometerse a participar activamente. Se constituye el equipo de trabajo y se presenta el proyecto a la organización. Es imprescindible transmitir que el Plan de TI/SI es **un plan de toda la organización**.

- Decisión de la dirección general
- Formación del grupo base
- Identificación de áreas de análisis
- Formación del equipo definitivo

Fase II — Descripción de la Situación Actual

Se describen las **funciones y procesos de negocio** por área y los subsistemas de información existentes. Se elabora una crítica desde perspectiva **técnica** (tecnología, rendimientos, interrelaciones) y de **negocio** (grado de soporte, puntos fuertes y débiles).

- Funciones y procesos de negocio por área
- Descripción de sistemas existentes
- Crítica técnica y de negocio
- Validación por subdirectores generales

Elaboración del Plan de TI/SI

La planificación propiamente dicha: identificación de necesidades, estructura del SI emergente y selección del plan definitivo.

01

Necesidades de información

Entrevistas con responsables de áreas para inventariar necesidades de TI/SI no cubiertas o cubiertas insatisfactoriamente por los sistemas actuales.

03

Propuestas alternativas

Los especialistas preparan **3-4 escenarios coherentes** con criterios generales (integración, capacidad de SI, coste) y estratégicos de la empresa.

02

Estructura del SI emergente

Análisis de gabinete para identificar la estructura global del SI: procesos fundamentales, entidades de datos, subsistemas candidatos e intervalos de decisión.

04

Aprobación del Plan

El Comité de TI/SI evalúa, selecciona y prioriza. El coste lo estima el equipo técnico; el beneficio, los usuarios. Resultado: **plan consensuado para 3-5 años.**

Programación de Actividades

Esta fase es principalmente responsabilidad de los **técnicos**. El DOP elabora la lista de proyectos necesarios para implementar los sistemas del Plan aprobado, propone la asignación de recursos y somete el calendario detallado del **primer año** a aprobación del Comité de SI.

IV.1 — Descripción detallada

Calendario concreto para el primer año y validación.

IV.2 — Inclusión presupuestaria

Proyectos incluidos en el presupuesto del período siguiente.

IV.3 — Plan de evaluación

Mecanismos de revisión periódica del Plan.

Consideraciones clave

El proceso completo puede requerir de **1-2 semanas a 4-5 meses** según el tamaño de la empresa. Es importante que el DOP planifique y controle el proceso para evitar alargamientos.

Existen herramientas informatizadas de apoyo al proceso de documentar y estructurar la información: catálogos de entidades de datos, matrices de relaciones y esquemas gráficos de estructuras.

Resumen: Características Esenciales de los Procedimientos de Planificación de SI

La descripción del procedimiento de alineamiento permite destacar sus características principales, que constituyen la esencia de este tipo de metodologías.



Proceso «de la empresa»

Debe ser llevado a cabo y dirigido por **personal propio**, aunque pueda pensarse en ayuda externa por razones metodológicas o como elemento de control. Las más altas instancias directivas de todas las áreas deben participar activamente, y la alta dirección hacerlo suyo de manera explícita.



Análisis Coste-Beneficio en Dos Fases

El **coste** es estimado por personal técnico del departamento de SI —responsables del desarrollo—; el **beneficio** por personal «de negocio», idealmente en un marco estratégico. Esto es lógico porque los técnicos desarrollarán los sistemas, mientras que los usuarios sacarán —o no— el «juego de negocio».



Dos Dimensiones en Momentos Distintos

Las «filas» (funciones y procesos de negocio) se utilizan desde el primer momento; las «columnas» (criterios estratégicos) empiezan a jugar un papel explícito más hacia el final. Introducir el «filtro estratégico» demasiado pronto tiene el riesgo de prescindir de necesidades que al final pueden estar muy relacionadas con otras de mayor importancia estratégica.



Aprendizaje Organizativo

El proceso genera un nivel de comunicación poco común entre técnicos y directivos. Tanto en entrevistas como en reuniones de elaboración y presentación de resultados, el enfoque centrado en funciones y procesos de negocio impone un diálogo que es una **magnífica ocasión para aprender** de los colegas. Plantearse explícitamente este objetivo de aprendizaje es importante.



El procedimiento descrito no es el único válido; debe tomarse como una ilustración que reúne las características más importantes que deben exhibir este tipo de metodologías de alineamiento del Plan de TI/SI con la estrategia de negocio.
